

Avance Plan de Reconstrucción

Post Terremoto y Tsunami 16 Septiembre 2015



Gobierno Regional de Coquimbo

24 de abril de 2017



CONSTITUCIÓN DIRECTORIO DE LA RECONSTRUCCIÓN



El Directorio de la Reconstrucción se constituyó el día 13 de marzo de 2017.

En la primera reunión se presentaron los avances de la etapa de emergencia y de las iniciativas que componen el Plan de Reconstrucción, las que son informadas mensualmente por cada uno de los organismos que tienen compromisos.

ESTADO INICIATIVAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN AL 31 DE MARZO DE 2017






Servicios Públicos que participan del Plan de Reconstrucción:

- Gobierno Regional de Coquimbo
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Obras Públicas
- Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes
- Ministerio de Minería
- Ministerio de Bienes Nacionales



Datos por Eje de Reconstrucción




Iniciativas MINVU (Proyectos de Urbanización)


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|--------------------------------------|----------------------|---|--|
| Coquimbo | Reposición Av. Costanera De Coquimbo | M\$ 2.611.969 | EJECUCIÓN 53% Avance Programado 2017 | |



| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|------------|---|----------------------|---------------|--|
| Combarbalá | Mejoramiento Plaza De Armas De Combarbalá (Ejecución) | M\$ 700.458 | LICITACIÓN | |

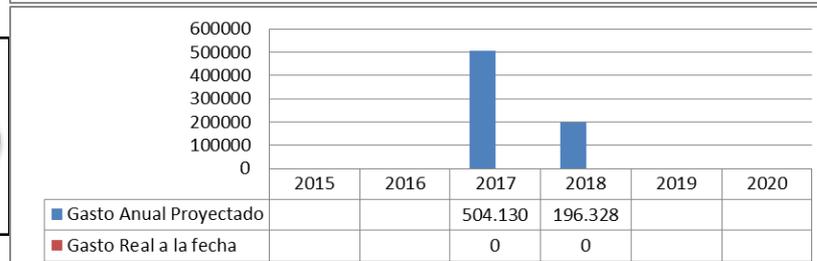

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-----------|--|----------------------|---------------------------|--|
| Punitaqui | Mejoramiento Plaza Pueblo Viejo, Punitaqui (Ejecución) | M\$ 687.582 | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | |

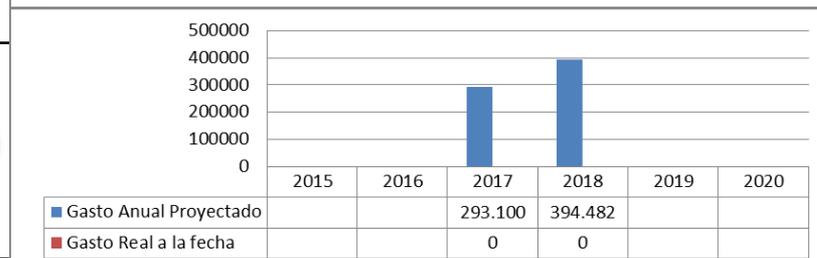


Datos por Eje de Reconstrucción




Iniciativas MINVU (Proyectos de Urbanización)


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-----------|--|----------------------|----------------|--|
| Los Vilos | Reposición Paseo Peatonal de Los Vilos (Ejecución) | M\$ 513.400 | EVALUACIÓN MDS | |

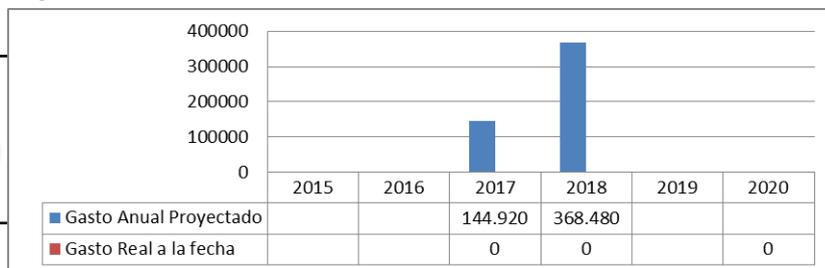

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--------|--|----------------------|---------------|--|
| Canela | Mejoramiento Espacio Público Rosa Vicencio (Ejecución) | M\$ 721.850 | FORMULACIÓN | |

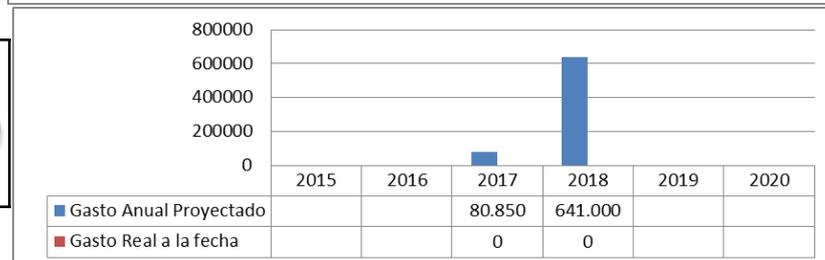

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--------|---|----------------------|---|--|
| Canela | Pavimentación de Calle Silvano Contreras en La comuna de Canela (Ejecución) | M\$ 508.454 | EJECUCIÓN 13% Avance Programado 2017 | |

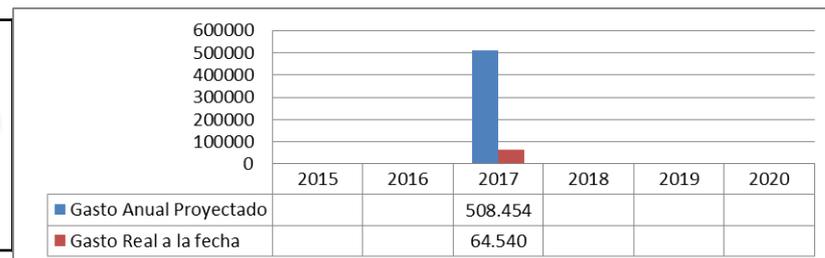


Datos por Eje de Reconstrucción




Iniciativas MINVU (Proyectos de Urbanización)


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-----------|--|----------------------|---------------|--|
| Salamanca | Construcción Paseo Peatonal Costanera Río Choapa Etapa Poniente. (Ejecución) | M\$ 824.000 | FORMULACIÓN | |

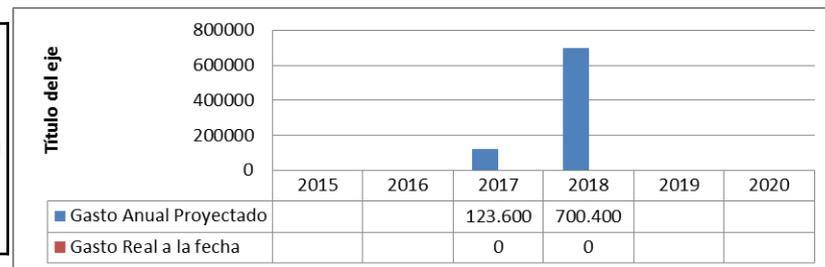

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--|---|----------------------|---|--|
| Ovalle - Combarbalá - Illapel - Canela | Conservación Muros De Contención Intervales - Illapel, Canela, Sotaquí y Ovalle (Ejecución) | M\$ 1.659.541 | EJECUCIÓN 62% Avance Programado 2017 | |

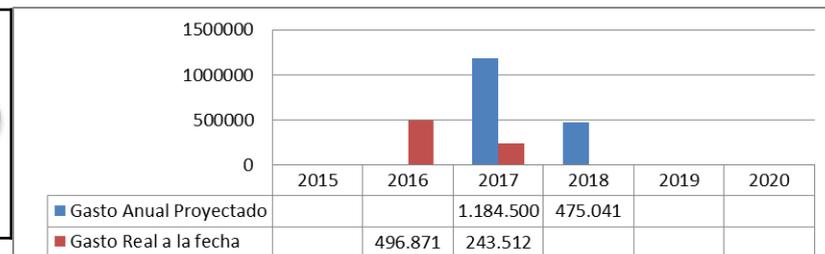

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|--|----------------------|---|--|
| Coquimbo | Construcción Vías Evacuación Zona Costera La Serena y Coquimbo | M\$ 5.203.570 | EJECUCIÓN 42% Avance Programado 2017 | |

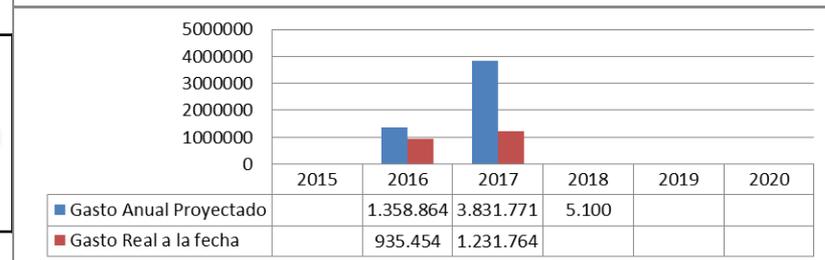


Datos por Eje de Reconstrucción



Iniciativas MINVU (Proyectos de Urbanización)

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--|---|----------------------|--|--|
| Canela - Ovalle - Combarbalá - Monte Patria - Illapel | Conservación de Muros Interviviendas Provincia Del Choapa | M\$ 783.670 | 4 etapas, 1 y 2 Etapa adjudicadas; 3 Y 4 en licitación | |

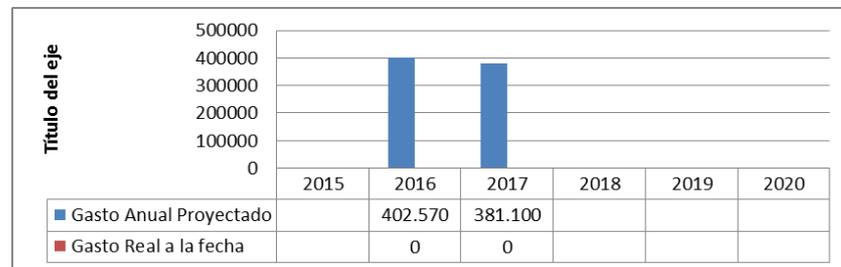

Datos por Eje de Reconstrucción



VIVIENDA

SALUD

EDUCACIÓN Y CULTURA

INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO

ECONOMÍA

PESCA ARTESANAL


PEQUEÑA MINERÍA

AGRICULTURA


BORDE COSTERO

Iniciativas MINVU (Instrumentos de Planificación Territorial)


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|-------------------------------------|----------------------|---------------|--|
| Coquimbo | Plan Regulador Comunal de Coquimbo. | M\$160.000 | TERMINADO | |

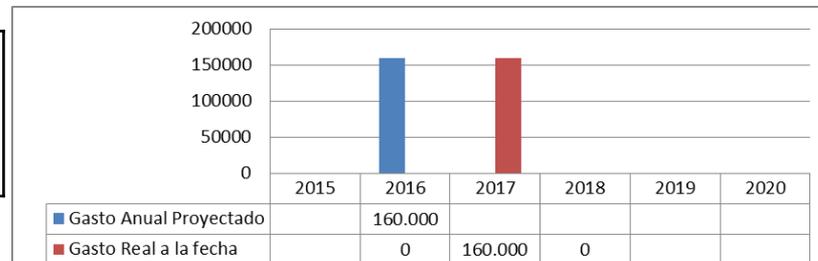

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------|--|
| Illapel-Salamanca-Canela -Los Vilos | Plan Regulador Intercomunal de Choapa. | M\$87.958 | TERMINADO | |

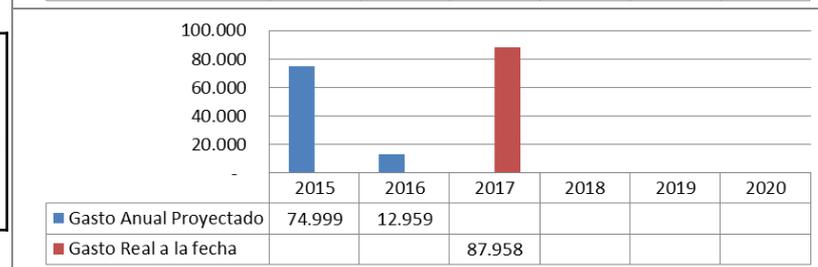

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-----------------|---|----------------------|---------------|--|
| Paihuano-Vicuña | PRC Vicuña y Paihuano .Estudio actualización de planes. | M\$139.400 | TERMINADO | |

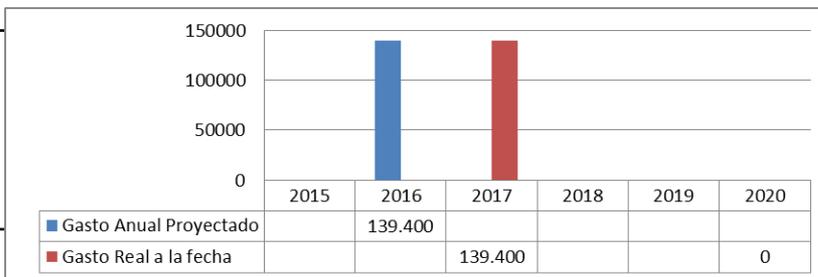


Datos por Eje de Reconstrucción




Iniciativas MINVU (Instrumentos de Planificación Territorial)


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-------------------|--|----------------------|---|--|
| Vicuña - Paihuano | Actualización PRI Elqui Estudio De Riesgos Paihuano - Vicuña (Consultoría) | M\$ 100.000 | EJECUCIÓN 30% Avance Programado 2017 | |

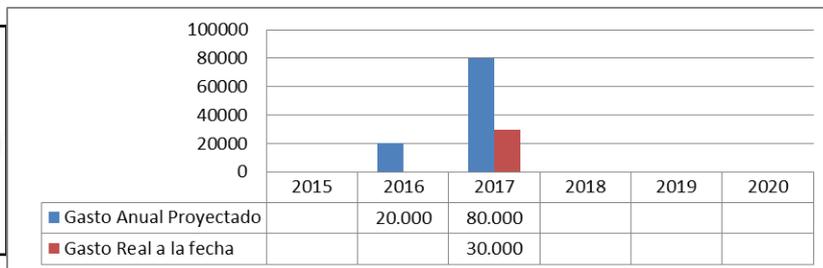

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|---|----------------------|---|--|
| Coquimbo | Actualización PRI Elqui Estudio de Riesgo Bahía de Coquimbo (Consultoría) | M\$ 98.400 | EJECUCIÓN 30% Avance Programado 2017 | |

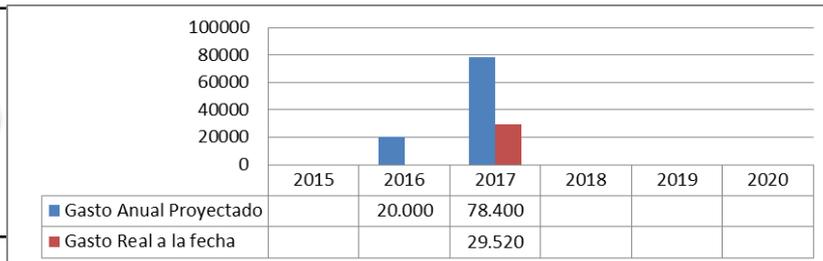

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|
| Ovalle-Punitaqui-Monte Patria-Combarbalá - Río Hurtado | Actualización PRI Limarí | M \$ 148.000 | EJECUCIÓN 13% Avance Programado 2017 | |

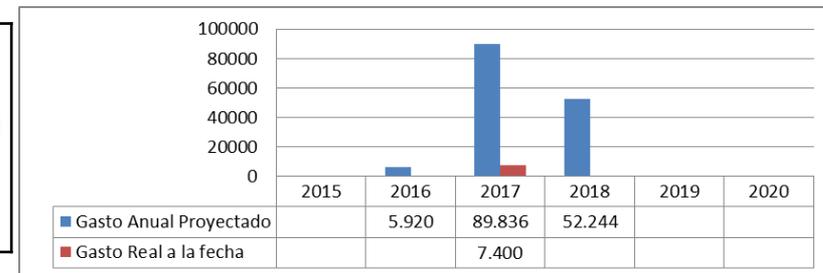


Datos por Eje de Reconstrucción




SUBSIDIOS SERVIU (Viviendas)


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-------------------|---|----------------------|---|--|
| Todas las comunas | Reparaciones mayores y moderadas de Viviendas | M\$ 34.133.125 | EJECUCIÓN 27% Avance Programado 2017 | |

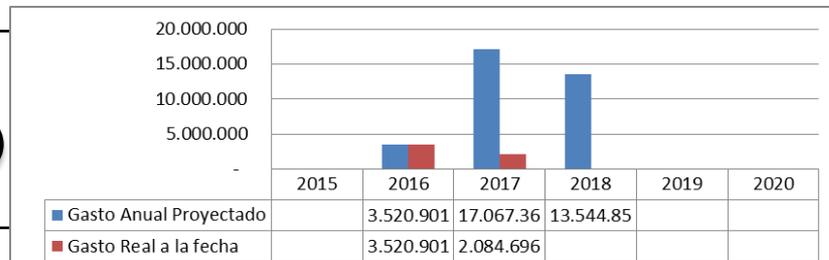

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|---|--|
| Todas las comunas | Sistema Integrado de Subsidio | M\$ 28.515.912 | EJECUCIÓN 37% Avance Programado 2017 | |

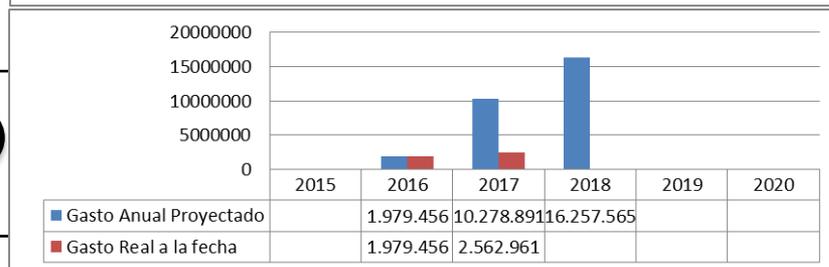

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|---|--|
| Todas las comunas | Fondo Solidario de Vivienda | M\$ 8.681.055 | EJECUCIÓN 28% Avance Programado 2017 | |

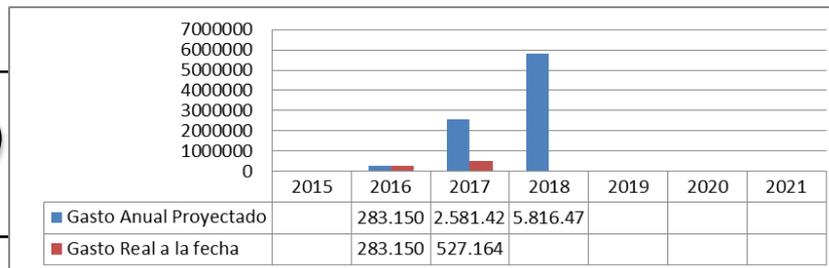


Datos por Eje de Reconstrucción




SUBSIDIOS SERVIU (Viviendas)


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|---|----------------------|---------------|--|
| Coquimbo | Compra de Terrenos Comité de Allegados sector Baquedano | M\$ 856.000 | TERMINADO | |

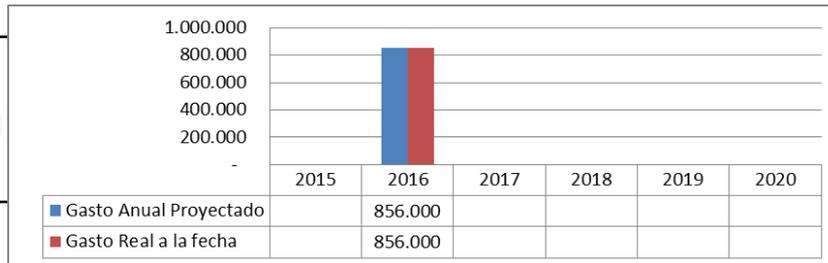

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|---------------------------------------|----------------------|--|--|
| Coquimbo | Transacción Terrenos sector Baquedano | M\$ 3.000.000 | EJECUCIÓN 47% Avance Programado 2017 | |

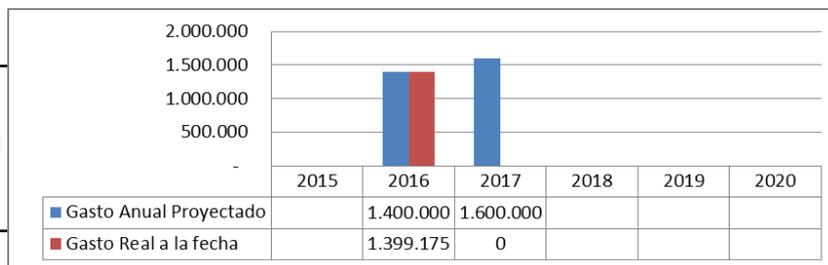

Datos por Eje de Reconstrucción



Iniciativas MIDESO (Viviendas)

| Nº | COMUNA | Medida Reconstrucción Propuesta (Nombre de la Iniciativa) | COSTO APROXIMADO M\$ | ESTADO DE LA INICIATIVA | % DEL GASTO HOY |
|----|--------------|--|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | Andacollo | PROGRAMA HABITABILIDAD Implementar soluciones en el ámbito de habitabilidad relacionadas con reparaciones de techumbres, módulos, instalaciones eléctricas, pisos, agua potable, baños, camas, mobiliario, etc. | \$ 69.550 | TERMINADO | 100% |
| 2 | Canela | | \$ 111.800 | TERMINADO | 100% |
| 3 | Combarbalá | | \$ 82.350 | TERMINADO | 100% |
| 4 | Coquimbo | | \$ 138.450 | TERMINADO | 100% |
| 5 | Illapel | | \$ 113.125 | TERMINADO | 100% |
| 6 | Los Vilos | | \$ 84.375 | TERMINADO | 100% |
| 7 | Monte Patria | | \$ 58.500 | TERMINADO | 100% |
| 8 | Ovalle | | \$ 78.300 | TERMINADO | 100% |
| 9 | Paihuano | | \$ 37.500 | TERMINADO | 100% |
| 10 | Punitaqui | | \$ 54.000 | TERMINADO | 100% |
| 11 | Río Hurtado | | \$ 39.000 | TERMINADO | 100% |
| 12 | Salamanca | | \$ 82.550 | TERMINADO | 100% |
| 13 | Vicuña | | \$ 78.000 | TERMINADO | 100% |




Datos por Eje de Reconstrucción



Iniciativas BB.NN. (Viviendas)

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual |
|-------------------|--|----------------------|---|
| Todas las comunas | Catastro, Estudio De Títulos Y Saneamiento De Títulos De Viviendas Dañadas por el Terremoto Y Tsunami. | M\$ 151.314 | EJECUCIÓN 4% Avance Programado 2017 |

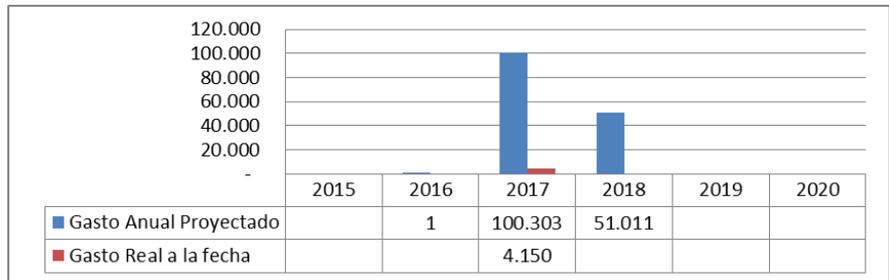


Datos por Eje de Reconstrucción




Iniciativas Reparación Infraestructura Hospitalaria por parte del Ministerio de Salud.-


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|--------------------------|----------------------|---------------|--|
| Coquimbo | Demolición Torre Antigua | M\$ 994.861 | TERMINADO | |

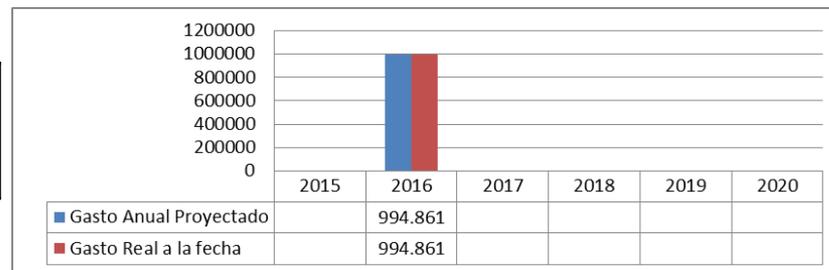

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|---------------------------------|----------------------|---------------|--|
| Coquimbo | Hospital Construcción Acelerada | M\$ 3.214.504 | LICITACIÓN | |

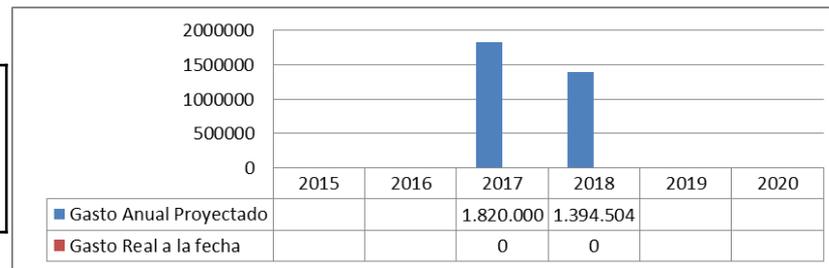

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|-------------------------------|----------------------|--|--|
| Coquimbo | Habilitación UCA y Endoscopía | M\$ 1.230.286 | EJECUCIÓN 50% Avance Programado 2017 | |

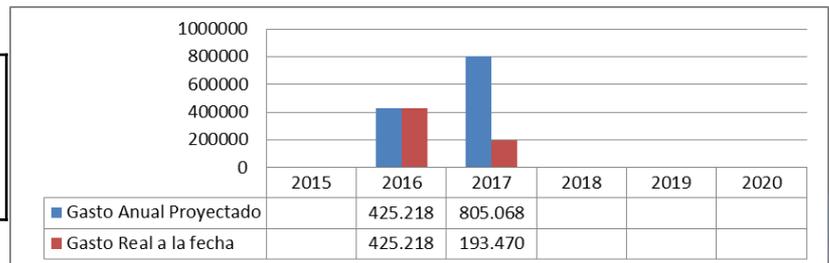


Datos por Eje de Reconstrucción




Iniciativas Reparación Infraestructura Hospitalaria por parte del Ministerio de Salud.-


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|-----------------------------|----------------------|---------------|--|
| Coquimbo | Habilitación Esterilización | M\$ 200.000 | FORMULACIÓN | |

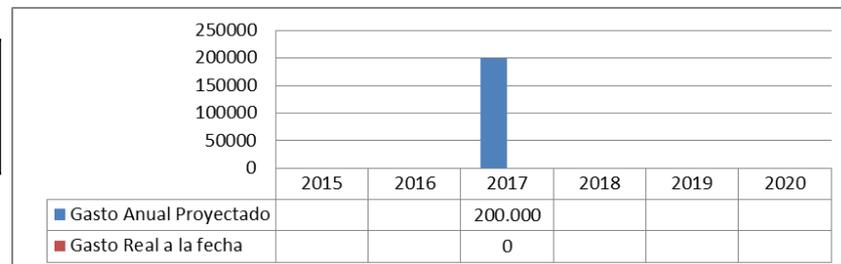

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|-------------------|----------------------|---------------|--|
| Coquimbo | Otros trabajos | M\$ 2.130.349 | TERMINADO | |

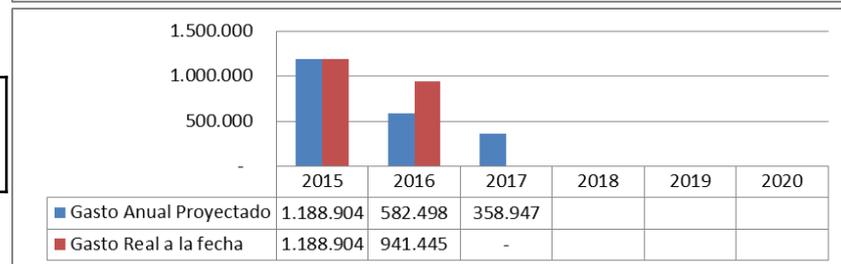

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--------|--|----------------------|---------------|--|
| Ovalle | Conservación Post-Terremoto Hospital De Ovalle | M\$ 481.980 | TERMINADO | |

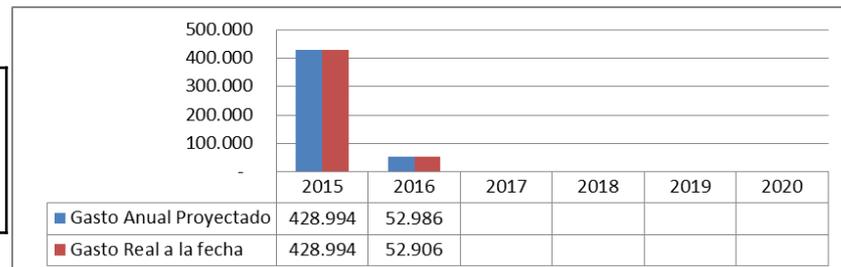

Datos por Eje de Reconstrucción




Iniciativas Reparación Infraestructura Hospitalaria por parte del Ministerio de Salud.-


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-----------|---|----------------------|---------------|--|
| Andacollo | Conservación Post-Terremoto Hospital De Andacollo | M\$ 21.363 | TERMINADO | |




| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|---------|---|----------------------|---------------|--|
| Illapel | Conservación Post-Terremoto Hospital De Illapel | M\$ 327.560 | TERMINADO | |



| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-----------|---|----------------------|---------------|--|
| Salamanca | Conservación Post-Terremoto Hospital De Salamanca | M\$ 57.684 | TERMINADO | |



| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|------------|--|----------------------|---------------|--|
| Combarbalá | Conservación Post-Terremoto Hospital De Combarbalá | M\$ 81.119 | TERMINADO | |

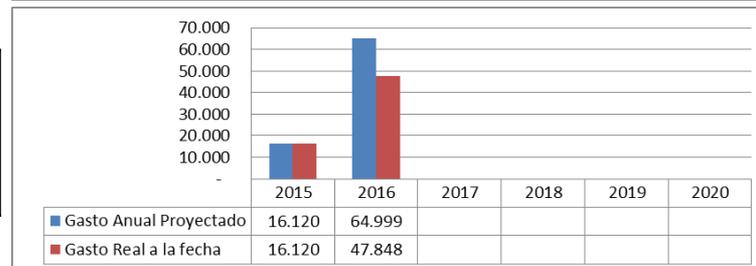


Datos por Eje de Reconstrucción



FRIL Estaciones Médico Rural (GORE).-

| Nº | COMUNA | Medida Reconstrucción Propuesta (Nombre de la Iniciativa) | COSTO APROXIMADO M\$ | ESTADO DE LA INICIATIVA |
|----|--------------|--|----------------------|-------------------------|
| 86 | Andacollo | Fril Estaciones Médico Rural: Considera financiamiento para habilitación, reparación, reposición y/o construcción de EMR priorizadas por los Municipios. | \$ 36.993 | SIN INICIAR |
| 87 | Coquimbo | | \$ 78.283 | SIN INICIAR |
| 88 | Paihuano | | \$ 44.476 | SIN INICIAR |
| 89 | Vicuña | | \$ 48.265 | SIN INICIAR |
| 90 | Combarbalá | | \$ 86.077 | SIN INICIAR |
| 91 | Monte Patria | | \$ 99.502 | SIN INICIAR |
| 92 | Ovalle | | \$ 75.152 | SIN INICIAR |
| 93 | Punitaqui | | \$ 74.859 | SIN INICIAR |
| 94 | Río Hurtado | | \$ 54.255 | SIN INICIAR |
| 95 | Canela | | \$ 105.542 | SIN INICIAR |
| 96 | Illapel | | \$ 97.016 | SIN INICIAR |
| 97 | Los Vilos | | \$ 39.469 | SIN INICIAR |
| 98 | Salamanca | | \$ 65.104 | SIN INICIAR |




Datos por Eje de Reconstrucción



Iniciativas MOP

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-----------|--|----------------------|---|---|
| Los Vilos | Construcción Muro Verteolas Costero Los Vilos Por Reconstrucción | M\$ 1.832.819 | EJECUCIÓN 47% Avance Programado 2017 | ● |

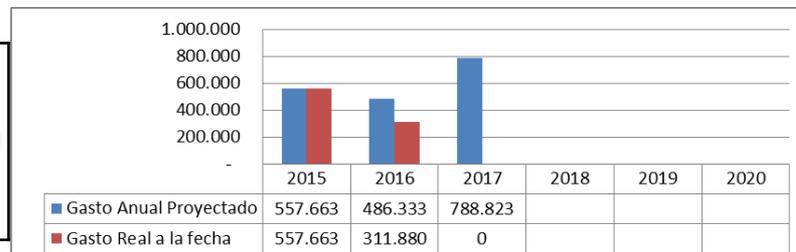

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|---|----------------------|---------------|---|
| Coquimbo | Construcción Caleta Coquimbo Por Reconstrucción | M\$ 2.000.000 | FORMULACIÓN | ○ |



| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|---|----------------------|---------------|---|
| Coquimbo | Construcción Del Muro Costanera Coquimbo Por Reconstrucción | M\$ 4.000.000 | FORMULACIÓN | ○ |



| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|--|----------------------|---------------|---|
| Coquimbo | Construcción Paseo Costero Sector Tongoy Etapa 1 | M\$ 3.469.515 | TERMINADO | ● |




Datos por Eje de Reconstrucción




Iniciativas MOP


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|--------------------------------------|----------------------|--|--|
| Coquimbo | Conservación Caleta Coquimbo 3 Etapa | M\$ 700.000 | EJECUCIÓN Programada a partir de Abril | |

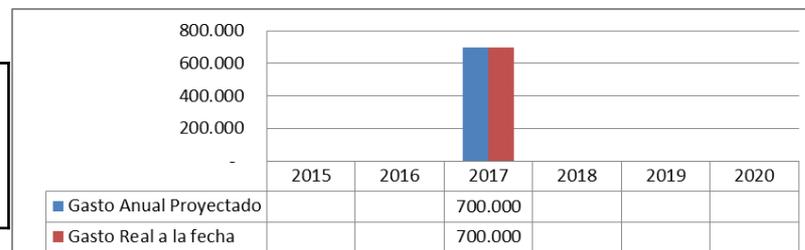

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|-------------------------------------|----------------------|---------------|--|
| Coquimbo | Conservación Borde Costero Coquimbo | M\$ 362.000 | TERMINADO | |

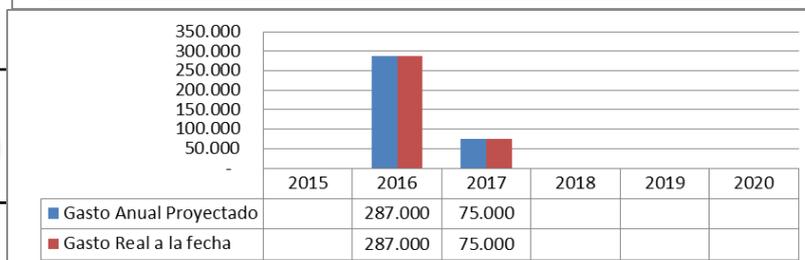

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|------------|---|----------------------|--------------------------------------|--|
| Provincial | Diagnóstico y Plan de Acción Iglesias del Limarí. | M\$ 170.644 | EJECUCIÓN 41% Avance Programado 2017 | |

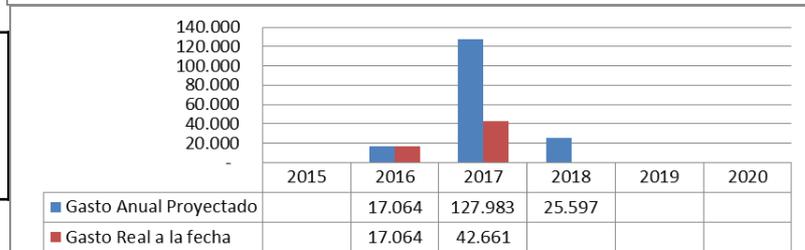

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--------|-------------------------------------|----------------------|---------------|--|
| Ovalle | Reparación de Daños Iglesia Sotaquí | M\$ 300.000 | FORMULACIÓN | |




GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

Datos por Eje de Reconstrucción




Iniciativas Inversión Reconstrucción Infraestructura Cultural (CNCA)


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|---|----------------------|--|--|
| Coquimbo | Adquisición de equipamiento para habilitación de la Casa de la Cultura de Coquimbo. | M\$ 28.647 | TERMINADO A la espera de reintegro de saldo | |

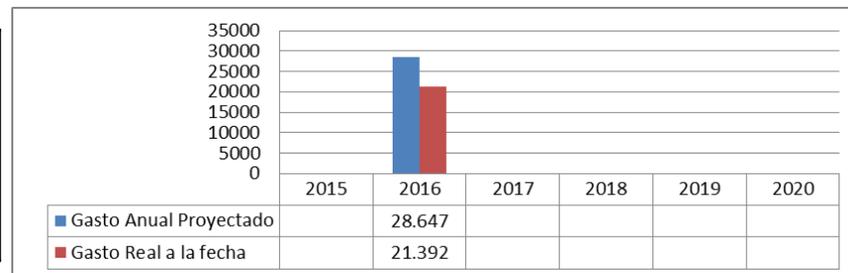

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|---|----------------------|---------------|--|
| Coquimbo | Reposición muro Casa de las Artes de Coquimbo. Beneficiario | M\$ 100.408 | TERMINADO | |

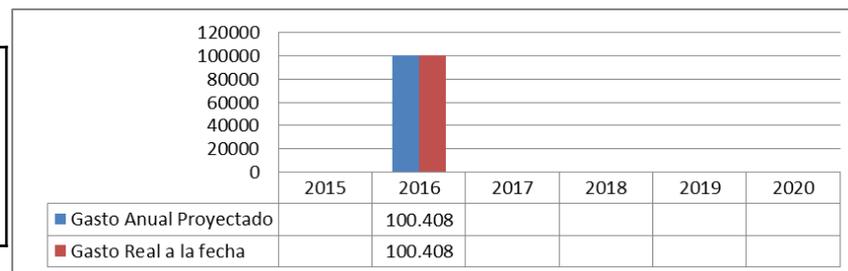

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|----------------------------------|----------------------|---------------|--|
| Coquimbo | Habilitación Galería Chile Arte. | M\$ 39.405 | TERMINADO | |

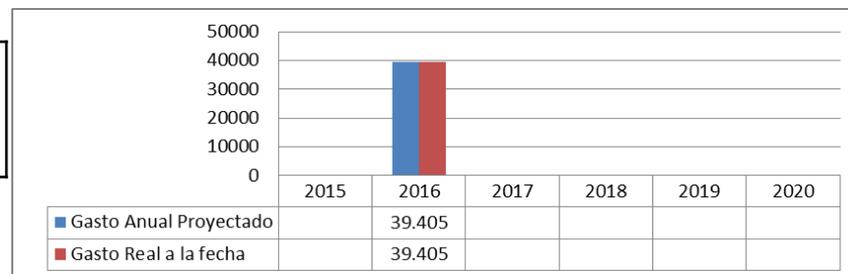


Datos por Eje de Reconstrucción




Iniciativas Inversión Reconstrucción Infraestructura Cultural (CNCA)


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--------|---|----------------------|---|--|
| Vicuña | Reparación y restauración Casa de la Cultura de Vicuña. | M\$ 88.545 | EJECUCIÓN 61% Avance Programado 2017 | |

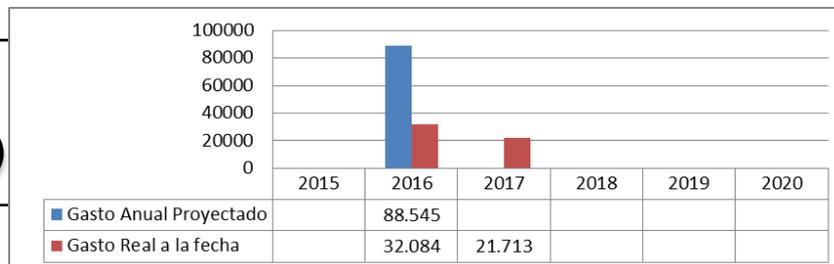

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--------|---|----------------------|---|--|
| Ovalle | Mejoramiento integral edificio Ex Estación de trenes de Ovalle, Biblioteca Publica. | M\$ 144.344 | EN REEVALUACIÓN Por parte de Municipio para considerar nuevas partidas | |

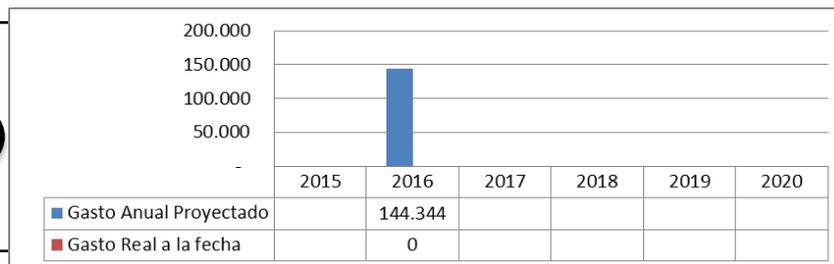

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-----------|--|----------------------|--|--|
| Salamanca | Reparación Centro Cultural y Deportivo Santa Rosa. | M\$ 120.000 | NO INICIADO Problemas asociados al uso suelo PR Comunal | |

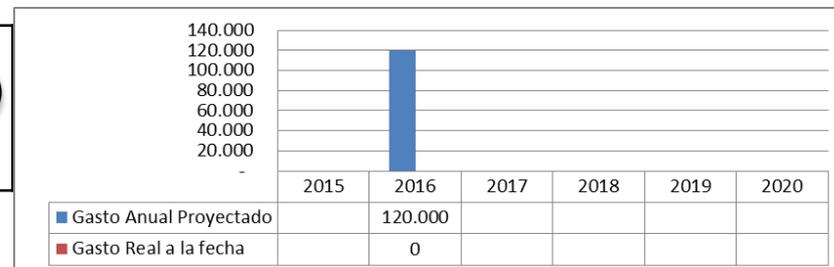


Datos por Eje de Reconstrucción




Iniciativas Inversión Reconstrucción Infraestructura Educación (MINEDUC)


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|---|----------------------|---------------|--|
| Coquimbo | Reparaciones Fachadas Y Gimnasio Diego Portales | M\$ 162.899 | TERMINADO | |




| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|---|----------------------|---|--|
| Coquimbo | Reparación Cierre Perimetral Escuela Peñuelas | M\$ 74.155 | NO INICIADO Municipio no ha resuelto observaciones | |



| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|--|----------------------|---------------|--|
| Coquimbo | Reparaciones Fachadas e Infraestructura Menor Escuela Coquimbo | M\$ 191.359 | TERMINADO | |



| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|--|----------------------|---|--|
| Coquimbo | Mejoramiento Estructural Liceo Carmen Rodríguez Tongoy | M\$ 200.000 | NO INICIADO Municipio no ha resuelto observaciones | |




Datos por Eje de Reconstrucción




Iniciativas Inversión Reconstrucción Infraestructura Educación (MINEDUC)


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|---------|---|----------------------|---------------|--|
| Illapel | Habilitación Salas De Clases, Ss. Higiénicos y Cocina Escuela Juan Carrasco Risco | M\$ 192.916 | TERMINADO | |




| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|---------|---|----------------------|---------------|--|
| Illapel | Habilitación de SS. Básicos Y Recintos Administrativos Esc. San Rafael De Rozas | M\$ 211.377 | TERMINADO | |

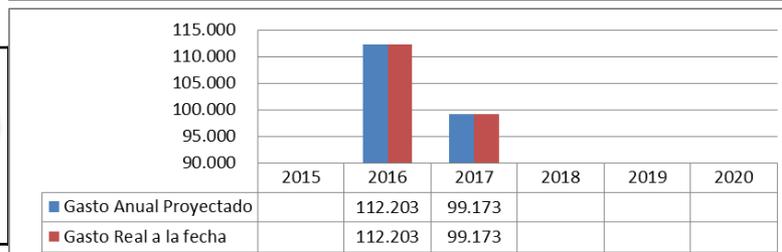

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--------|--|----------------------|---------------|--|
| Canela | Construcción Segunda Etapa Escuela Provisoria de Canela Alta | M\$ 700.070 | TERMINADO | |



| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-----------|---|----------------------|---|--|
| Los Vilos | Conservación Liceo Nicolás Federico Lohse | M\$ 272.897 | NO INICIADO Municipio no ha resuelto observaciones | |




Datos por Eje de Reconstrucción




Iniciativas Inversión Reconstrucción Infraestructura Educación (MINEDUC)


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--------------|--|----------------------|---|--|
| Monte Patria | Habilitación Liceo De Emergencia Eduardo Frei Montalva | M\$ 686.443 | NO INICIADO Municipio no ha resuelto observaciones | |




| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--------|----------------------------|----------------------|--|--|
| Canela | Escuela Básica Canela Alta | M\$ 2.500.000 | NO INICIADO Municipio no ha presentado proyecto | |

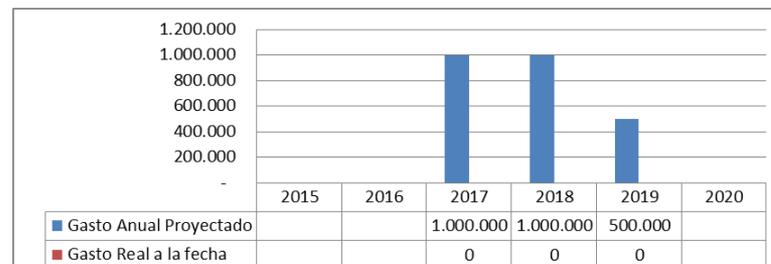

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--------|------------------------------------|----------------------|--|--|
| Canela | Escuela Básica José Miguel Carrera | M\$ 120.000 | NO INICIADO Municipio no ha presentado proyecto | |

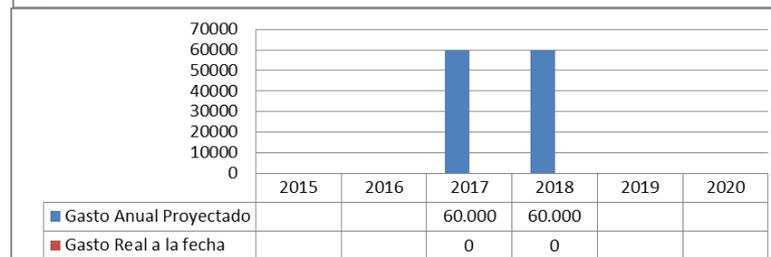

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--------|-------------------------------------|----------------------|--|--|
| Canela | Escuela Básica Eusebio Lillo Robles | M\$ 120.000 | NO INICIADO Daños no atribuibles al terremoto | |

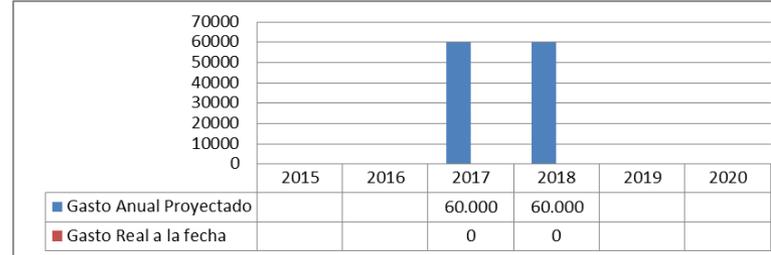


Datos por Eje de Reconstrucción




Iniciativas Inversión Reconstrucción Infraestructura Educación (MINEDUC)


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--------|---------------------------|----------------------|--|--|
| Canela | Escuela Básica El Totoral | M\$ 200.000 | NO INICIADO Daños no atribuibles al terremoto | |

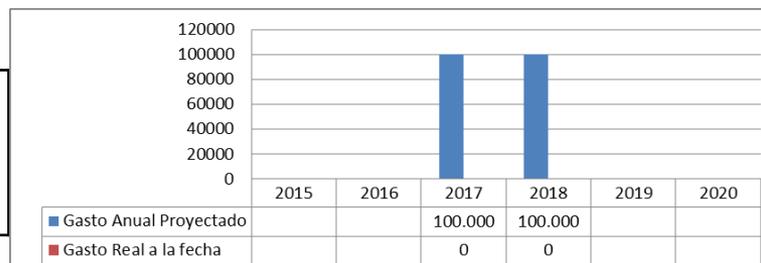


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|------------|---------------------------------|----------------------|--|--|
| Combarbalá | Escuela Básica Rosita O'Higgins | M\$ 120.000 | NO INICIADO Daños no atribuibles al terremoto | |

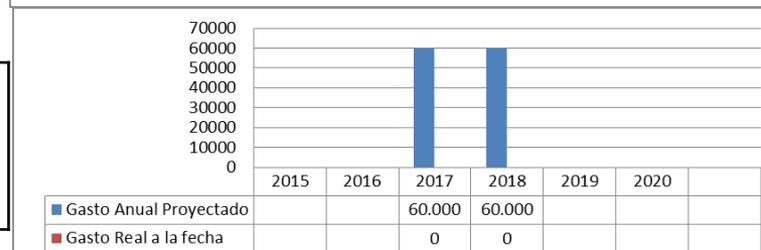

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|------------|----------------------------------|----------------------|--|--|
| Combarbalá | Escuela Básica Pedro De Valdivia | M\$ 200.000 | NO INICIADO Municipio no ha presentado proyecto | |



| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|------------|------------------------------|----------------------|--|--|
| Combarbalá | Escuela Básica Claudio Matte | M\$ 70.000 | NO INICIADO Municipio no ha presentado proyecto | |

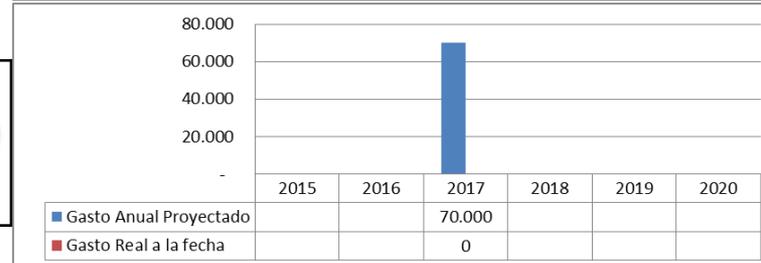


Datos por Eje de Reconstrucción




Iniciativas Inversión Reconstrucción Infraestructura Educación (MINEDUC)


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|------------|--|----------------------|--|--|
| Combarbalá | Escuela Básica San Luis Amigo Y Ferrer | M\$ 200.000 | NO INICIADO Daños no atribuibles al terremoto | |

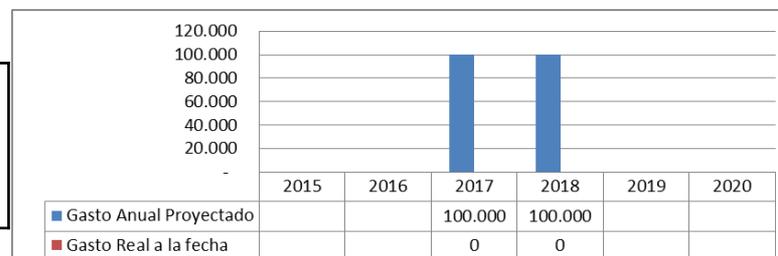

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|------------|-------------------------------|----------------------|--|--|
| Combarbalá | Escuela Básica Laurita Vicuña | M\$ 85.000 | NO INICIADO Daños no atribuibles al terremoto | |

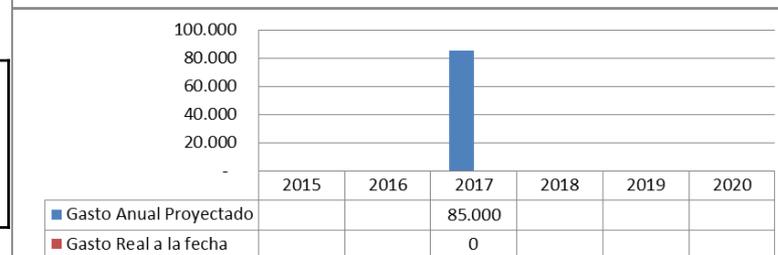

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|------------|--|----------------------|--|--|
| Combarbalá | Escuela Básica Juanita Fernández Solar | M\$ 85.000 | NO INICIADO Daños no atribuibles al terremoto | |

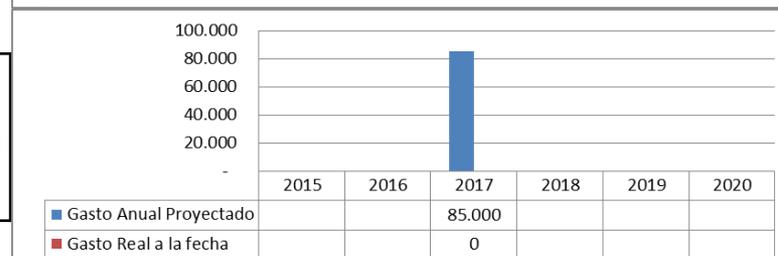

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|---------|------------------------------|----------------------|--|--|
| Illapel | Liceo Domingo Ortíz de Rozas | M\$ 79.691 | NO INICIADO Municipio no ha presentado proyecto | |




Datos por Eje de Reconstrucción




Iniciativas Inversión Reconstrucción Infraestructura Educación (MINEDUC)


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|---------|------------------------------------|----------------------|--|--|
| Illapel | Escuela Básica San Rafael de Rozas | M\$ 855.270 | NO INICIADO En evaluación en SECREDUC desde el 17/03/2017 | |

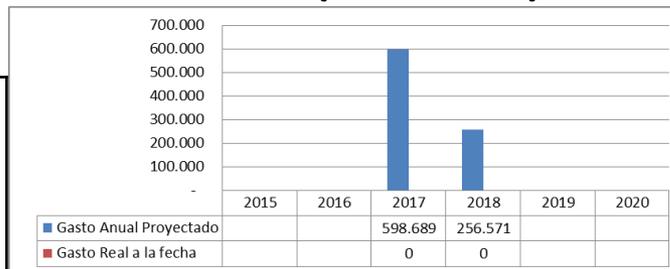


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--------------|--|----------------------|--|--|
| Monte Patria | Liceo Presidente Eduardo Frei Montalva | M\$ 2.000.000 | NO INICIADO Municipio no ha presentado proyecto | |

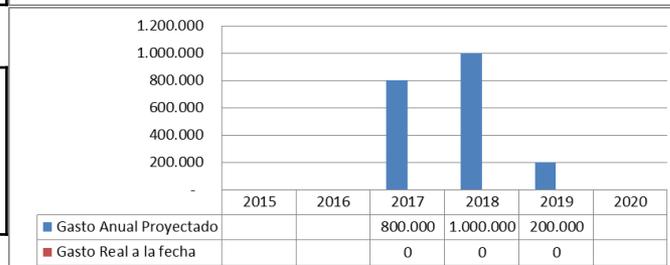

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-----------|-------------------|----------------------|--|--|
| Punitaqui | Escuela Bélgica | M\$ 169.008 | NO INICIADO Sólo recursos transferidos al Municipio | |

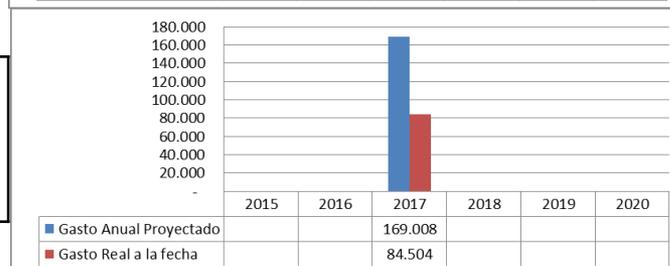

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-----------|--------------------------|----------------------|--|--|
| Salamanca | Escuela Básica Chillepin | M\$ 80.000 | NO INICIADO Municipio no ha presentado proyecto, recursos transferidos al Municipio | |

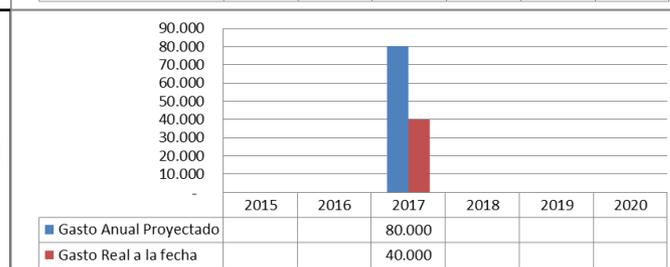


Datos por Eje de Reconstrucción



Iniciativas Inversión Reconstrucción Infraestructura Educación (MINEDUC)

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| Vicuña | Colegio Joaquín Vicuña Larraín | M\$ 150.000 | NO INICIADO Municipio no ha presentado proyecto | |

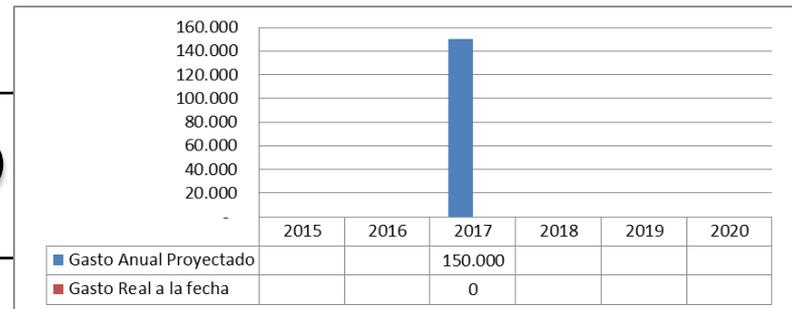

Datos por Eje de Reconstrucción



Iniciativas Inversión Reconstrucción PEQUEÑA MINERÍA

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|---|----------------------|---------------|--|
| Regional | Suplemento Programa FNDR Mineros de Ley III | M\$ 380.000 | TERMINADO | |




Datos por Eje de Reconstrucción




FRIL Comunitario (GORE)


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-----------|-------------------|----------------------|--|--|
| Andacollo | FRIL Comunitario | M\$ 110.980 | NO INICIADO Municipio deuda FRIL anterior | |

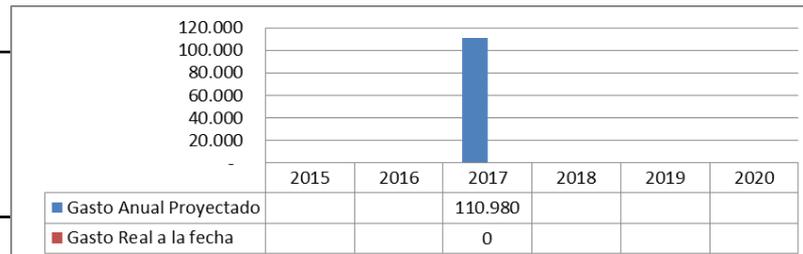


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|-------------------|----------------------|---|--|
| Coquimbo | FRIL Comunitario | M\$ 234.850 | NO INICIADO Municipio debe subsanar problemas de comodatos | |

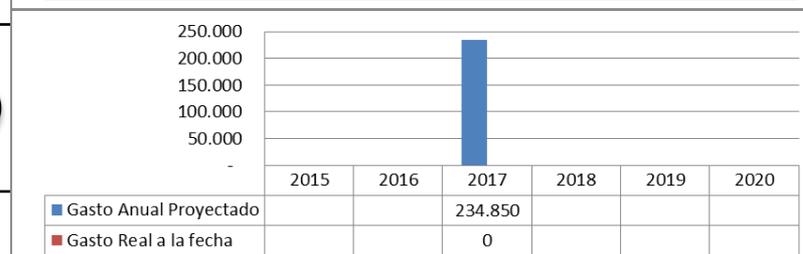

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|----------|-------------------|----------------------|--|--|
| Paihuano | FRIL Comunitario | M\$ 133.428 | EJECUCIÓN 4 proyectos aprobados 3 en ejecución | |

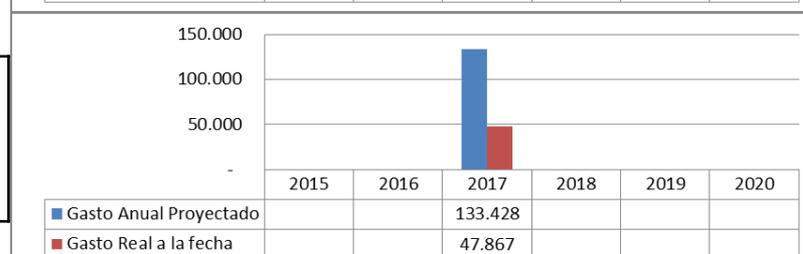

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--------|-------------------|----------------------|--|--|
| Vicuña | FRIL Comunitario | M\$ 144.796 | EJECUCIÓN 4 proyectos aprobados 3 en ejecución | |

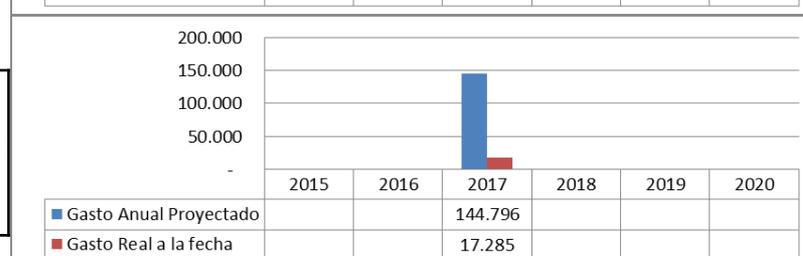


Datos por Eje de Reconstrucción




FRIL Comunitario (GORE)


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Combarbalá | FRIL Comunitario | M\$ 258.230 | EJECUCIÓN 5 proyectos aprobados 4 en ejecución | |




| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Monte Patria | FRIL Comunitario | M\$ 298.506 | EJECUCIÓN 3 proyectos aprobados 2 en ejecución | |



| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--------|-------------------|----------------------|--|--|
| Ovalle | FRIL Comunitario | M\$ 225.457 | EJECUCIÓN 2 proyectos aprobados 2 en ejecución | |



| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-----------|-------------------|----------------------|--|--|
| Punitaqui | FRIL Comunitario | M\$ 224.576 | EJECUCIÓN 3 proyectos aprobados 1 en ejecución | |



Datos por Eje de Reconstrucción




FRIL Comunitario (GORE)


| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Río Hurtado | FRIL Comunitario | M\$ 162.764 | EJECUCIÓN 2 proyectos aprobados 2 en ejecución | |




| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|--------|-------------------|----------------------|--|--|
| Canela | FRIL Comunitario | M\$ 316.626 | EJECUCIÓN 5 proyectos aprobados 4 en ejecución | |

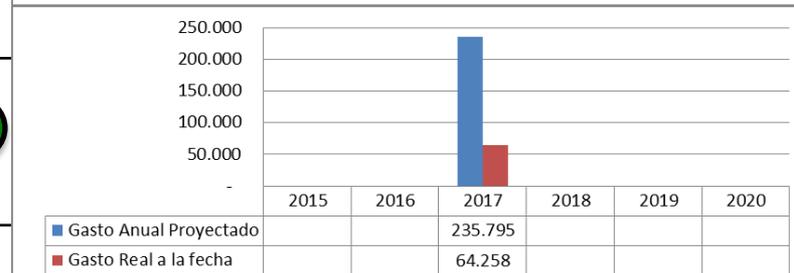

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|---------|-------------------|----------------------|--|--|
| Illapel | FRIL Comunitario | M\$ 291.047 | EJECUCIÓN 5 proyectos aprobados 3 en ejecución | |

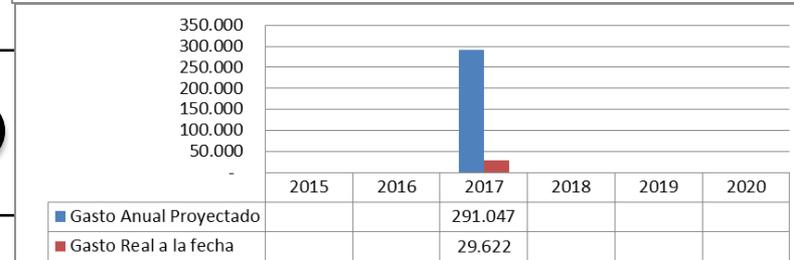

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-----------|-------------------|----------------------|--|--|
| Los Vilos | FRIL Comunitario | M\$ 118.408 | EJECUCIÓN 2 proyectos aprobados 2 en ejecución | |

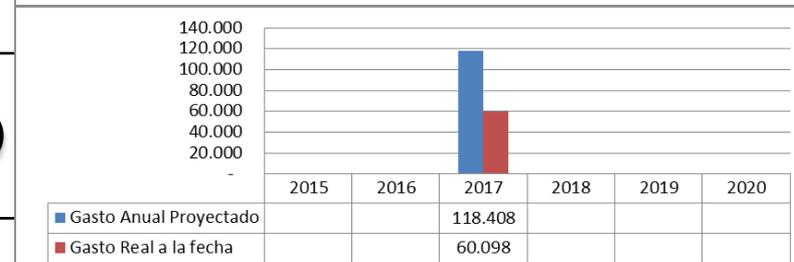


Datos por Eje de Reconstrucción




FRIL Comunitario (GORE)

| Comuna | Nombre Iniciativa | Monto Total Estimado | Estado Actual | |
|-----------|-------------------|----------------------|--|--|
| Salamanca | FRIL Comunitario | M\$ 195.313 | EJECUCIÓN 2 proyectos aprobados 1 en ejecución | |

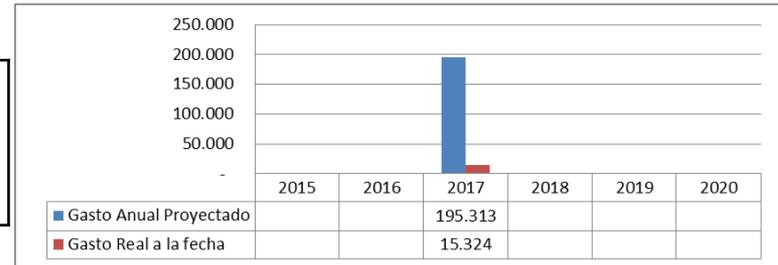



RESUMEN AVANCE AL 31 DE MARZO DE 2017

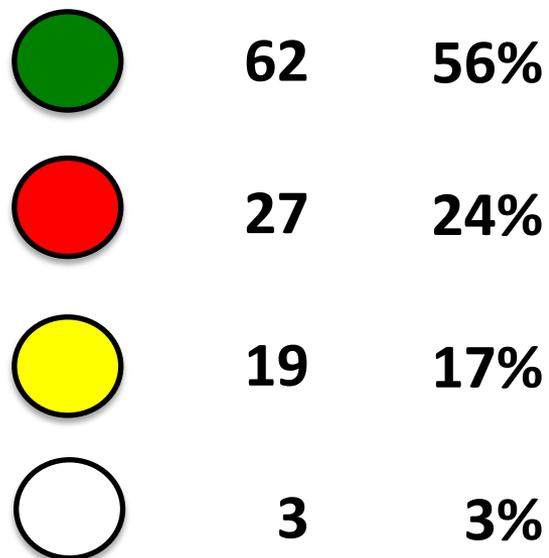



Gracias

Gobierno Regional de Coquimbo

Abril 2017



ESTADO ETAPA EMERGENCIA AL 31 DE MARZO DE 2017



ANTECEDENTES

Detalle por comuna de viviendas afectadas que cumplen con los requisitos para acceder a beneficios MINVU-SERVIU (Abril 2017)

| PROVINCIA | COMUNA | CATASTRO MINVU | | | | Total |
|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| | | 2 Daño REPARABLE LEVE | 3 Daño REPARABLE MODERADO | 4 Daño REPARABLE MAYOR | 5 Daño NO REPARABLE | |
| ELQUI | LA HIGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | LA SERENA | 10 | 11 | 29 | 30 | 80 |
| | COQUIMBO | 164 | 207 | 205 | 145 | 721 |
| | VICUÑA | 31 | 95 | 121 | 78 | 325 |
| | PAIHUANO | 7 | 9 | 15 | 38 | 69 |
| | ANDACOLLO | 49 | 67 | 85 | 48 | 249 |
| TOTAL ELQUI | | 261 | 389 | 455 | 339 | 1444 |
| LIMARÍ | OVALLE | 242 | 251 | 283 | 258 | 1034 |
| | RÍO HURTADO | 86 | 86 | 121 | 47 | 340 |
| | MONTE PATRIA | 310 | 318 | 386 | 431 | 1445 |
| | COMBARBALÁ | 306 | 245 | 295 | 345 | 1191 |
| | PUNITAQUI | 131 | 107 | 180 | 101 | 519 |
| TOTAL LIMARÍ | | 1075 | 1007 | 1265 | 1182 | 4529 |
| CHOAPA | ILLAPEL | 608 | 397 | 371 | 229 | 1605 |
| | CANELA | 233 | 197 | 223 | 357 | 1010 |
| | LOS VILOS | 19 | 8 | 7 | 13 | 47 |
| | SALAMANCA | 266 | 168 | 204 | 183 | 821 |
| TOTAL CHOAPA | | 1126 | 770 | 805 | 782 | 3483 |
| TOTAL REGIONAL | | 2462 | 2166 | 2525 | 2303 | 9456 |

ETAPA DE EMERGENCIA

Hacia las personas damnificadas

- **Entrega de insumos de emergencia** (cajas de alimentos, agua, carpas, colchones, frazadas, kit de aseo, entre otros).
- **Bono Enseres**, ayuda económica consistente en 1 millón de pesos en el caso de los afectados por el tsunami y terremoto, y 500 mil pesos para los damnificados por el terremoto.
4.383 bonos enseres entregados, equivalentes a M\$ 2.701.000.

Vivienda

- **1.747 viviendas de emergencia entregadas**, 1.623 viviendas construidas (**93% avance**).
- **1.000 baños entregados**, 566 baños construidos (**57% avance.**)
- **642 demoliciones y 462 instalaciones de viviendas**, lo que equivale a un monto transferido de **M\$ 1.684.440.**
- **72 bonos de acogida por M\$ 52.800.**
- **2.205 subsidios banco de materiales Daño 2 Reparable Leve.**
- **1.368 Tarjetas de Banco de Materiales activadas y 234 Proyectos aprobados por resolución Reparar Viviendas con Daño 3 Reparable Moderado.**
- **1.441 subsidios asignados para Reparar Viviendas con Daño 4 Reparable Mayor**, 123 iniciados, 2 renunciadas, 1.016 sin inicio y 30 terminados.
- **1.622 subsidios asignados de Viviendas con Daño 5 No Reparable**, 379 Proyectos en ejecución, 1.113 sin inicio y 130 terminados.



Situación Viviendas de Emergencia

| | COMUNA | VIVIENDA ENTREGADAS | VIVIENDA CONSTRUIDAS | VIVIENDAS NO INSTALADAS | % Avance Construcción Viviendas respecto a Viviendas Entregadas |
|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---|
| ELQUI | LA HIGUERA | - | - | - | - |
| | LA SERENA | 12 | 7 | 5 | 58% |
| | COQUIMBO | 66 | 36 | 30 | 55% |
| | VICUÑA | 40 | 40 | 0 | 100% |
| | PAIHUANO | 17 | 17 | 0 | 100% |
| | ANDACOLLO | 23 | 23 | 0 | 100% |
| TOTAL ELQUI | | 158 | 123 | 35 | 78% |
| LIMARÍ | OVALLE | 100 | 96 | 4 | 96% |
| | RÍO HURTADO | 33 | 33 | 0 | 100% |
| | MONTE PATRIA | 242 | 230 | 12 | 95% |
| | COMBARBALÁ | 337 | 295 | 42 | 88% |
| | PUNITAQUI | 111 | 103 | 8 | 93% |
| TOTAL LIMARÍ | | 823 | 757 | 66 | 92% |
| CHOAPA | ILLAPEL | 237 | 218 | 19 | 92% |
| | CANELA | 340 | 336 | 4 | 99% |
| | LOS VILOS | 6 | 6 | 0 | 100% |
| | SALAMANCA | 183 | 183 | 0 | 100% |
| TOTAL CHOAPA | | 766 | 743 | 23 | 97% |
| TOTAL REGIONAL | | 1.747 | 1.623 | 124 | 93% |



Brechas Ministerio del Interior

Beneficios denominados Brechas Pendientes de entrega

- Viviendas de Emergencia.
- Bonos de Enseres.
- Aporte Extraordinario (\$300.000).
- Aporte Extraordinario a Familias que perdieron su fuente Laboral (\$400.000).
- Aporte a Familias afectadas tsunami sin solución habitacional.

| PROVINCIA | COMUNA | Brechas de Viviendas de Emergencia | Brechas de Bonos de Enseres | Brechas de Aporte extraordinario (\$300.000) | Brechas de Aporte extraordinario (\$400.000) | Familias afectadas tsunami sin solución habitacional | Total |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-------------|
| ELQUI | LA HIGUERA | - | - | - | - | - | 0 |
| | LA SERENA | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| | COQUIMBO | 1 | 52 | 2 | - | - | 55 |
| | VICUÑA | 8 | 3 | 0 | - | 28 | 39 |
| | PAIHUANO | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| | ANDACOLLO | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| TOTAL ELQUI | | 9 | 55 | 2 | 0 | 28 | 94 |
| LIMARÍ | OVALLE | 0 | 58 | 0 | 16 | - | 74 |
| | RÍO HURTADO | 0 | 1 | 123 | - | - | 124 |
| | MONTE PATRIA | 10 | 88 | 83 | - | - | 181 |
| | COMBARBALÁ | 0 | 39 | 70 | - | - | 109 |
| | PUNITAQUI | 8 | 33 | 84 | - | - | 125 |
| TOTAL LIMARÍ | | 18 | 219 | 360 | 16 | 0 | 613 |
| CHOAPA | ILLAPEL | 60 | 67 | 2 | - | - | 129 |
| | CANELA | 44 | 25 | 41 | - | - | 110 |
| | LOS VILOS | 0 | 6 | 0 | - | - | 6 |
| | SALAMANCA | 66 | 13 | 223 | - | - | 302 |
| TOTAL CHOAPA | | 170 | 111 | 266 | 0 | 0 | 547 |
| TOTAL REGIONAL | | 197 | 385 | 628 | 16 | 28 | 1254 |

Brechas Ministerio del Interior

Avance en Plataforma Ministerio del Interior (Abril 2017)

| PROVINCIA | COMUNA | Brechas de Viviendas de Emergencia | | | | Brechas de Bonos de Enseres | | | | Brechas de Aporte extraordinario (\$300.000) | | | |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| | | Documentación Completa | Documentación Parcial | Renuncias | Sin Antecedentes ingresados | Documentación Completa | Documentación Parcial | Renuncias | Sin Antecedentes ingresados | Documentación Completa | Documentación Parcial | Renuncias | Sin Antecedentes ingresados |
| ELQUI | LA HIGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | COQUIMBO | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | VICUÑA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PAIHUANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ANDACOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ELQUI | | 0 | 1 | 7 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIMARÍ | OVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RÍO HURTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | 0 | 6 | 0 |
| | MONTE PATRIA | 0 | 10 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| | COMBARBALÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| | PUNITAQUI | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL LIMARÍ | | 8 | 18 | 0 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 | 354 | 0 | 6 | 0 |
| CHOAPA | ILLAPEL | 0 | 42 | 18 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | CANELA | 33 | 43 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| | LOS VILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SALAMANCA | 0 | 48 | 18 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 143 | 80 | 0 | 0 |
| TOTAL CHOAPA | | 33 | 133 | 37 | 0 | 101 | 8 | 2 | 0 | 186 | 80 | 0 | 0 |
| TOTAL REGIONAL | | 41 | 152 | 44 | 0 | 370 | 8 | 7 | 0 | 542 | 80 | 6 | 0 |
